FC ENGENHARIA
Planejamento e Controle

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA DA OBRA

REFIS · Revisão Base: Baseline inicial
HOTEL DO PAPA - AMPLIAÇÃO DO 5 PAV · Avenida Getúlio Vargas, R. Santa Rita, 995, Aparecida - SP

R00
Relat. Nº 005
09/03/2026
STATUS EM

OBRA: **HOTEL DO PAPA - AMPLIAÇÃO DO 5 PAV** PERÍODO: **09/02/2026 → 31/05/2026**

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA DA OBRA (REFIS)

Base: Baseline inicial

R00
Relat Nº 05

OBRA	CLIENTE	LOCAL
HOTEL DO PAPA - AMPLIAÇÃO DO 5 PAV	—	Avenida Getúlio Vargas, R. Santa Rita, 995, Aparecida - SP

INÍCIO: 09/02/2026 STATUS EM: 09/03/2026 TÉRMINO DA OBRA: 31/05/2026

EVOLUÇÃO FÍSICA GLOBAL

Avanço Acumulado da Obra

Previsto · Realizado

PREVISTO ACUMULADO
19.7%
Meta: **100%**

REALIZADO ACUMULADO
19.3%
↘ Desvio -0.4%

Início: **09/02/2026** Prazo contratual: **31/05/2026** SPI: **0.98**

AVANÇO SEMANAL PREVISTO	AVANÇO SEMANAL REALIZADO	SPI — ÍNDICE DE DESEMPENHO
0.7%	0.8%	0.98 ⚠ Atenção

DESVIO FÍSICO
-0.4% ↘ Atrasado

CURVA S FÍSICA — AVANÇO ACUMULADO (%)

Previsto · Realizado · Tendência



Acumulado Previsto: **19.7%** Acumulado Realizado: **19.3%** Desvio: **-0.4%**

CURVA S FINANCEIRA — FATURAMENTO ACUMULADO (R$)

Previsto · Realizado · Tendência



Contrato Total: **R$ 1.730.000,00** Previsto Acumulado: **R$ 340.359,38** Realizado Acumulado: **R$ 333.439,20** Desvio Financeiro: **-R$ 6.920,18**

AVANÇO FÍSICO POR GRUPO

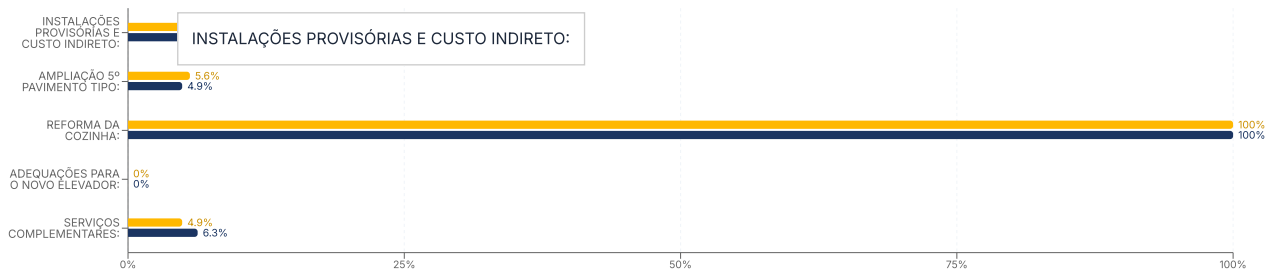

3 AMPLIAÇÃO 5º PAVIMENTO TIPO:

Previsto: **5.6%** Realizado: **4.9%** Desvio: **-0.7%**

SERVIÇOS PRELIMINARES:

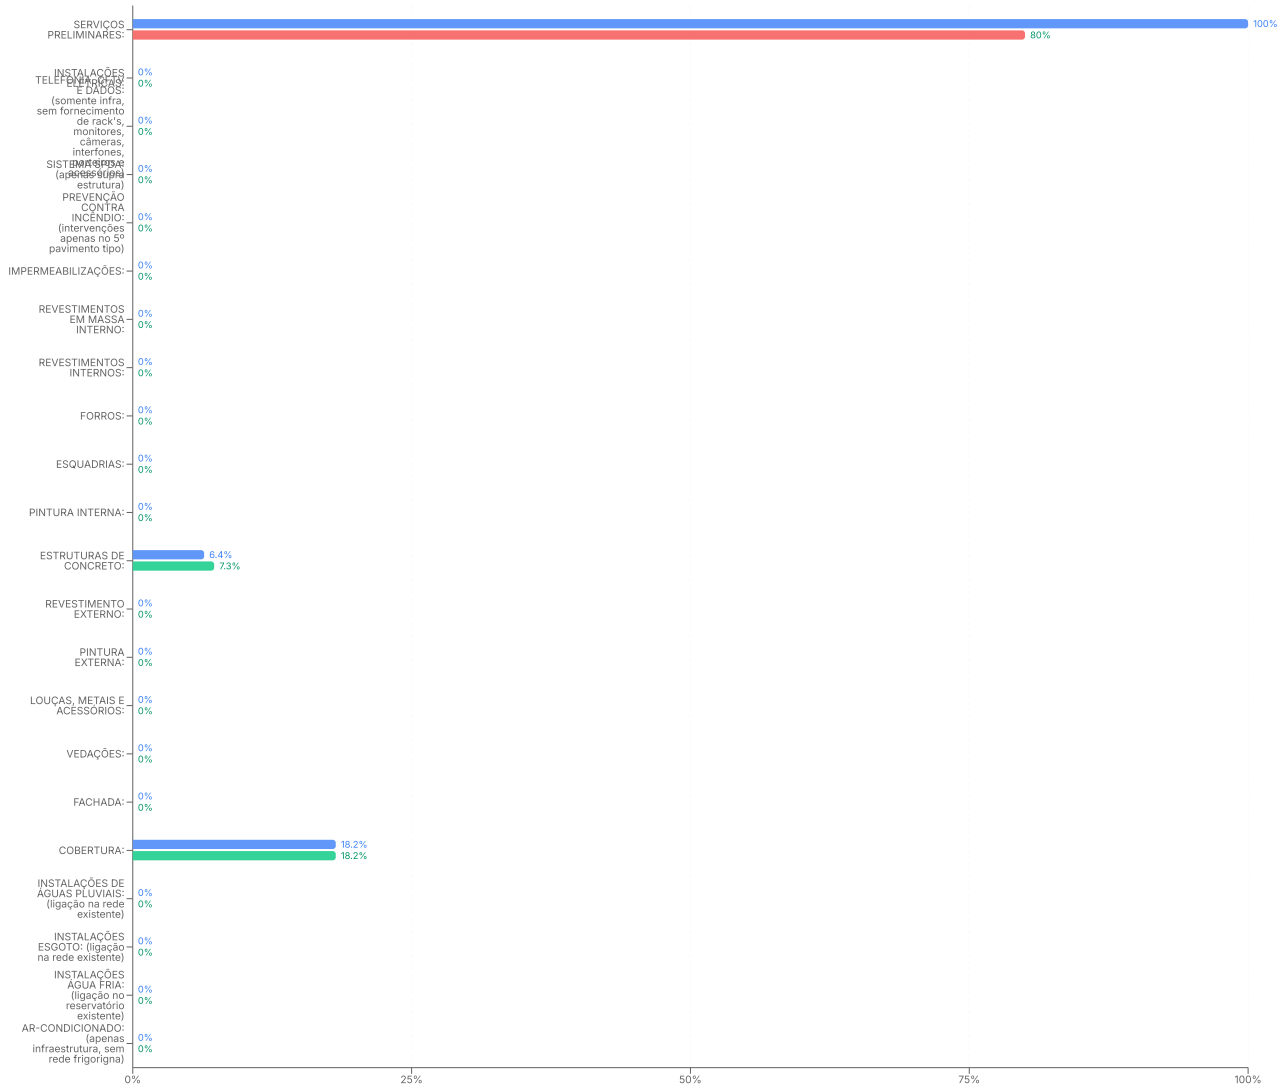

⚠ SERVIÇOS PRELIMINARES:: −20.0%

4 REFORMA DA COZINHA:

Previsto: **100.0%** Realizado: **100.0%** Desvio: **+0.0%**

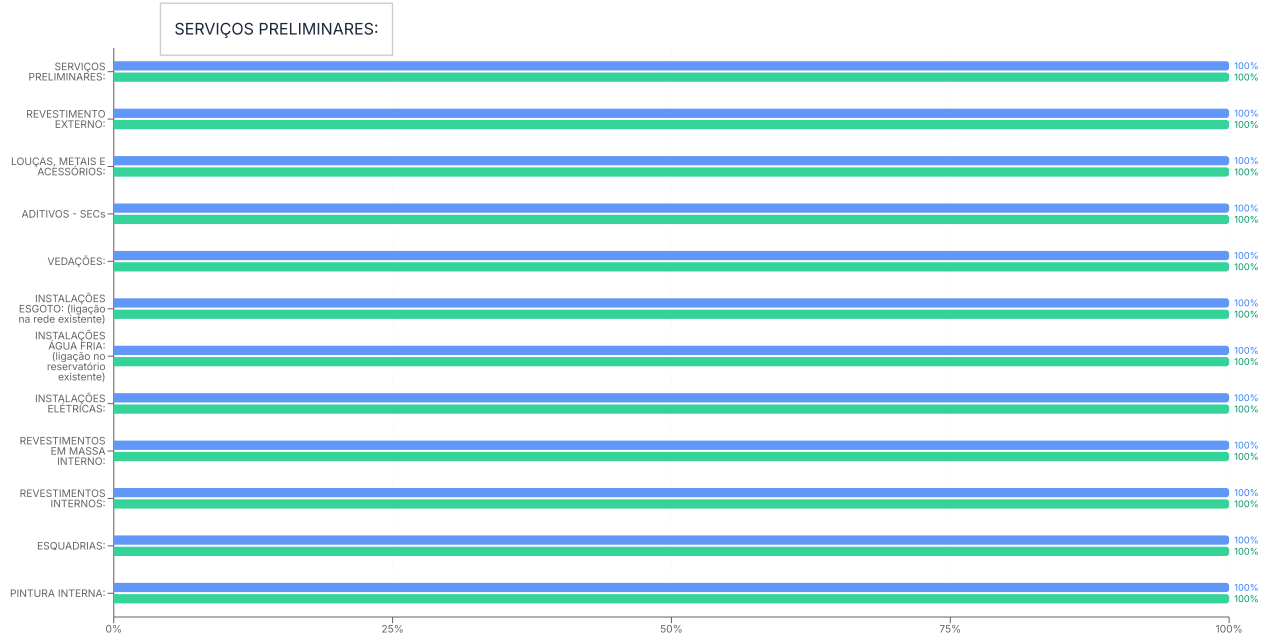

5 ADEQUAÇÕES PARA O NOVO ELEVADOR:

Previsto: **0.0%** Realizado: **0.0%** Desvio: **+0.0%**

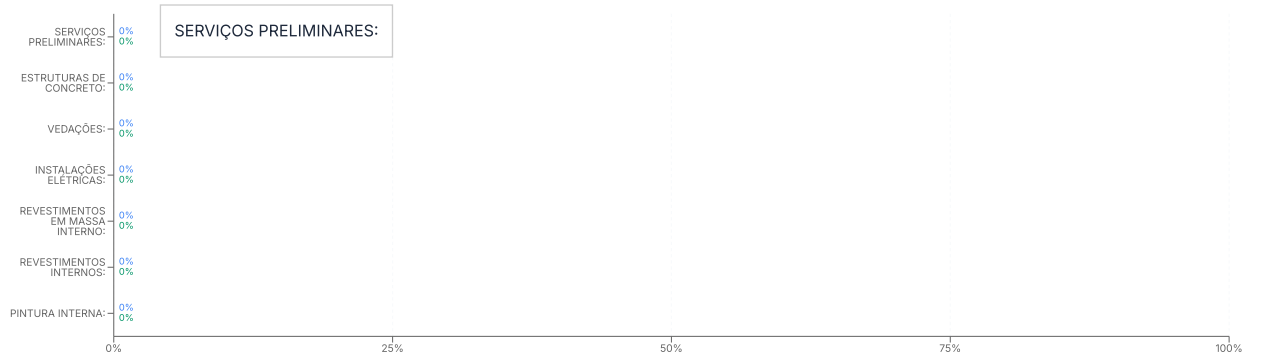

FATURAMENTO DO MÊS

Faturamento contratual do mês (março de 2026): **R$ 252.885,15**

FATURAMENTO PREVISTO NO MÊS
R$ 49.752,50
R$ 252.885,15 × 19.7% (avanço previsto)

FATURAMENTO REALIZADO NO MÊS
R$ 48.740,94
R$ 252.885,15 × 19.3% (avanço realizado)

DESVIO NO MÊS
-R$ 1.011,56
↘ -0.4% físico

Observações / Ocorrências

Registre ocorrências, problemas ou avanços relevantes desta semana...

HISTÓRICO DE RELATÓRIOS EMITIDOS

5 relatórios

Nº	SEMANA	PREV. ACUM.	REAL. ACUM.	DESVIO	SPI	FAT. PREVISTO	FAT. REALIZADO	DESVIO R$	OBSERVAÇÕES
005	09/03/2026 ATUAL	19.7%	19.3%	-0.4%	0.98	R$ 49.752,50	R$ 48.740,94	-R$ 1.011,56	—
004	02/03/2026	19.0%	18.5%	-0.5%	0.98	R$ 47.940,51	R$ 46.780,94	-R$ 1.159,57	—
003	23/02/2026	17.8%	17.7%	-0.0%	1.00	R$ 78.409,40	R$ 78.250,38	-R$ 159,02	—
002	16/02/2026	10.3%	17.1%	+6.8%	1.66	R$ 45.558,00	R$ 75.623,67	+R$ 30.065,67	—
001	09/02/2026	0.0%	4.2%	+4.2%	—	—	R$ 18.632,92	—	—
